



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY
Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Calimaya, México.

69

N° ENTIDAD FISCALIZABLE:

(1) MES: ENERO DE 2025

N° DE FONDO	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)
8	1235/37/01/09/01	ELECTRIFICACION EN CAMINO AL PANTEON	CONCEPCION	107,717.33	FEFOM 09/2014	107,717.33				-	107,717.33	-	PROCESO			100%	100%
9	1235/37/01/10/01	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ENTRE VICENTE GUERRERO Y FILIBERTO GOMEZ	COATIPAC SAN LORENZO	17,207.41	FEFOM 10/2014	17,207.41				-	17,207.41	-	PROCESO			100%	100%
10	1235/45/02/05/01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CUAUHTENCO TODO EL MUNICIPIO	292,585.26	FEFOM/0 5/2015	292,176.08				-	292,176.08	409.18	PROCESO			100%	100%
11	1235/45/02/07/01	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PIPILA ENTRE ALDAMA E INDEPENDENCIA	MUNICIPIO CABECERA	149,996.23	FEFOM/0 7/2015	149,996.19				-	149,996.19	0.04	PROCESO			100%	100%
12	1235/45/02/14/01	MODIFICACION DE ACCESO A LA ESC. SEC. OFIC. NO. 711 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CALLE MORELOS	MUNICIPAL SAN DIEGO LA HUERTA	22,487.67	FEFOM/1 4/2015	22,487.66				-	22,487.66	0.01	PROCESO			100%	100%

TOTALES

12 OBRAS

2,441,600.40

2,387,113.77

2,387,113.77

FECHA DE IMPRESIÓN

DÍA	MES	AÑO
29	04	2025



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY
 Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Calimaya, México.

69

N° ENTIDAD FISCALIZABLE:.

(1) MES: ENERO DE 2025

NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL 1235 ó 1236 (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCIERO (12)



OMAR GUILLERMO SANCHEZ VELÁZQUEZ
 Presidente(a) Municipal

JOSE ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
 Secretario Municipal

YAZMIN JESSICA ALEGRIA ALEGRIA
 Secretario(a) del Ayuntamiento

SULEYKA LEFICIA HERNÁNDEZ LEAL
 Director(a) Obras Públicas

Ver 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY

Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Calimaya, México.

69

N° ENTIDAD FISCALIZABLE:

(1) MES: FEBRERO DE 2025

CEN TRON C 1235 6 1236	Cuenta CONTABLE 1235 6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURS O Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235 (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 6 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 6 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES FINANCI ERO (12)
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	
8	1235/37/01/09 /01	ELECTRIFICACION EN CAMINO AL CONCEPCION	LA CONCEPCION	107,717.33	FEFOM	107,717.33				107,717.33	-	PROCESO			100%	100%
9	1235/37/01/10 /01	PANTEON ELECTRIFICACION DE LA CALLE COLOSIO ENTRE VICENTE	COATIPAC SAN LORENZO	17,207.41	09/2014 FEFOM	17,207.41				17,207.41	-	PROCESO			100%	100%
10	1235/45/02/05 /01	GUERRERO Y FILIBERTO GOMEZ REHABILITACION DE RED DE	CUAUHTENCO TODO EL	292,585.26	10/2014 FEFOM	292,176.08				292,176.08	409.18	PROCESO			100%	100%
11	1235/45/02/07 /01	AGUA POTABLE PAVIMENTACION DE LA CALLE EL	MUNICIPIO CABECERA	149,996.23	05/2015 FEFOM	149,996.19				149,996.19	0.04	PROCESO			100%	100%
12	1235/45/02/14 /01	INDEPENDENCIA MODIFICACION DE ACCESO A LA ESC. SEC. OFIC. NO. 711 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CALLE MORELOS	MUNICIPAL SAN DIEGO LA	22,487.67	07/2015 FEFOM	22,487.66				22,487.66	0.01	PROCESO			100%	100%

TOTALES 12 OBRAS 2,441,600.40 2,387,113.77 2,387,113.77

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	04	2025



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY

Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Calimaya, México.

69

N° ENTIDAD FISCALIZABLE:


(1) MES: FEBRERO DE 2025

NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURS O Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINANCI ERO (12)



OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

Presidente(a) Municipal



JOSE ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

Tesorero(a) Municipal



YAZMIN JESSICA ALEGRÍA ALEGRÍA

Secretario(a) del Ayuntamiento



SULEYKA LÉPTECIA HERNÁNDEZ LEAL

Director(a) Obras Públicas

Ver 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY

Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE

Municipio de Calimaya, México.

69

N° ENTIDAD FISCALIZABLE:

(1) MES:

MARZO DE 2025

N° REG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	PRESUPUESTO BASE	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235) (a)	INSUMOS			IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	SALDO POR EJERCER (7)	ESTATUS (8)	PÓLIZA		AVANCES	
							MATERIALES (2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO (4)					TIPO Y NÚMERO (9)	FECHA (10)	FÍSICO (11)	FINAN CIERO (12)
8	1235/37/01/09 /01	ELECTRIFICACION EN CAMINO AL PANTEON	CONCEPCION COATIPAC SAN LORENZO	107,717.33	FEFOM 09/2014	107,717.33				-	107,717.33	-	PROCESO			100%	100%
9	1235/37/01/10 /01	ELECTRIFICACION DE LA CALLE COLOSIO ENTRE VICENTE GUERRERO Y FILIBERTO GOMEZ	CUAUHTENCO TODO EL	17,207.41	FEFOM 10/2014	17,207.41				-	17,207.41	-	PROCESO			100%	100%
10	1235/45/02/05 /01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO CABECERA	292,585.26	FEFOM/05/2 015	292,176.08				-	292,176.08	409.18	PROCESO			100%	100%
11	1235/45/02/07 /01	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PIPILA ENTRE ALDAMA E INDEPENDENCIA	MUNICIPAL SAN DIEGO LA	149,996.23	FEFOM/07/2 015	149,996.19				-	149,996.19	0.04	PROCESO			100%	100%
12	1235/45/02/14 /01	MODIFICACION DE ACCESO A LA ESC. SEC. OFIC. NO. 711 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CALLE MORELOS	HUERTA	22,487.67	FEFOM/14/2 015	22,487.66				-	22,487.66	0.01	PROCESO			100%	100%
TOTALES											12 OBRAS	2,441,600.40	2,387,113.77	-	-	-	2,387,113.77

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	04	2025



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY

Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN (IMOA)

ENTIDAD FISCALIZABLE Municipio de Calimaya, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 69 (1) MES: MARZO DE 2025

Cuenta Contable 1235 ó 1236	Nombre de la obra o acción	Localidad	Presupuesto Base	Recurso y Año	Saldo Ejercicio Anterior (S.I. Cuenta 1235) (a)	Insumos			Importe Total (Cuenta 1235 ó 1236) (5)	Saldo Ejercicio Acumulado (S.F. Cuenta 1235 ó 1236) (6)	Saldo por Ejercer (7)	Estatus (8)	Póliza		Avances	
						Materiales (2)	Mano de Obra (3)	Maquinaria y Equipo (4)					Tipo y Número (9)	Fecha (10)	Físico (11)	Cierro (12)



OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
Presidente(a) Municipal



JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ
Tesorero(a) Municipal



YAZMIN JESSICA ALEGRÍA ALEGRÍA
Secretario(a) del Ayuntamiento



SULEYKA LEITCHA HERNÁNDEZ LEAL
Director(a) Obras Públicas

Ver 2021
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY
Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Nº. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	ENTIDAD FISCALIZABLE:	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (8)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)	TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 ó 1236 ó 1236 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		FECHA (21)	FÍSICO CIERO (22)	AVANCE	
													2%	0.2%	0.5%	OTROS (10)										TIPO Y NÚMERO (20)					
1	1235/1707/1	Municipio de Calimaya, México.	ELECTRIFICACIÓN DE CALLE	SAN LORENZO	163,185.35	FISM	163,185.35																	0.01	PROCESO					100%	100%
2	1/01 1235/11/02/2		PEDRO CARMONA ELECTRIFICACIÓN EN	CUAUHTENCO CABECERA	500,519.26	2009 FISM	500,519.26																	0.00	PROCESO					100%	100%
3	9/01 1235/27/02/0		ESCUELA CAPEP (JARDIN DE NIÑOS) Y ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIRES	MUNICIPAL SAN ANDRES	1,009,712.40	2008 FEFOM	1,009,089.42																	622.98	PROCESO					100%	100%
4	4/25 1235/27/02/0		PARAMENTOS CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM.	OCOTLAN ZARAGOZA DE	1,098,016.84	2012 FEFOM	918,105.35																	179,911.49	PROCESO					100%	84%
5	5/05 1235/29/02/0		PLAZA CIVICA MEJORAMIENTO DE CAMINO	GUADALUPE SAN LORENZO	155,980.15	2012 FISM	155,023.80																	956.35	PROCESO					100%	99%
6	4/01 1235/29/02/0		REAL CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE	CUAUHTENCO SAN LORENZO	66,984.18	2012 FISM	55,283.72																	11,710.46	PROCESO					100%	83%
7	5/01 1235/29/02/0		ISABEL VILCHIS CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE	CUAUHTENCO SAN LORENZO	116,997.39	2012 FISM	80,725.61																	36,271.78	PROCESO					100%	69%
8	6/01 1235/27/02/0		ISABEL VILCHIS CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	CUAUHTENCO SAN MARCOS	695,067.01	2012 FEFOM	579,545.87																	115,521.14	PROCESO					100%	83%
9	2/20 1235/29/02/0		PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE	DE LA CRUZ SAN MARCOS	952,569.44	2012 FISM	832,830.07																	119,739.37	PROCESO					100%	87%
10	1/25 1235/29/02/1		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUVO DE 61 CM. Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONG. INDEPENDENCIA HACIA EL ORIENTE UN RECORRIDO DE 200 MTS.	DE LA CRUZ CABECERA MUNICIPAL	235,654.00	2012 FISM	226,471.36																	9,182.64	PROCESO					100%	95%

Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY
Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

MES : (1) ENERO DE 2025

69

N° ENTIDAD FISCALIZABLE:

Municipio de Calimaya, Mexico.

ENTIDAD FISCALIZABLE:

Regresar principal

ORDEN	CUENTA CONTABLE 1235 6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 6 1235) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 6) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				SUB TOTAL (11)	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (16)	LIQUIDO NETO (19)	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 + 1236 6 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE																							
												2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)		AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)						TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)		FÍSICO (22)	FINAN CIERO (23)																					
11	1235/3901/0	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN LORENZO CUAUHTENCO"	MUNICIPAL CABECERA	5,500,000.00	PAD	5,500,000.00															5,500,000.00	0.00	PROCESO				100%	100%																						
12	1235/3901/0	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	MUNICIPAL CABECERA	5,480,613.53	PAD	5,480,613.53															5,480,613.53	0.00	PROCESO				100%	100%																						
13	1235/3901/0	REPAVIMENTACION DE VIALIDADES MUNICIPALES	MUNICIPAL CABECERA	4,998,282.03	PAD	4,998,282.03															4,998,282.03	0.00	PROCESO				100%	100%																						
14	1235/3901/0	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION LA JOYA PRIMERA ETAPA	MUNICIPAL CABECERA	998,930.00	PAD	998,930.00															998,930.00	0.01	PROCESO				100%	100%																						
15	1235/4001/0	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BARRANCA DE LOS ANGELES TRAMO DE LAS TORRES A JAVIER IBARRA	MUNICIPAL CABECERA	1,995,000.00	PAD	1,995,000.00															1,995,000.00	0.00	PROCESO				100%	100%																						
16	1235/4001/0	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION LA JOYA SEGUNDA ETAPA	MUNICIPAL CABECERA	998,900.00	PAD	998,900.00															998,900.00	0.00	PROCESO				100%	100%																						
17	1235/7101/0	CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN ANDRES OCOOTLAN-CALIMAYA TRAMO 0+000 AL 0+770	MUNICIPAL SAN ANDRES	12,486,638.96	RP	11,996,632.35															11,996,632.35	480,006.61	PROCESO				100%	96%																						
18	1235/7001/0	ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS CABECERA	MUNICIPAL CABECERA	1,390,362.09	FISM	1,390,362.09															1,390,362.09		PROCESO				100%	100%																						
19	1235/7001/0	ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	MUNICIPAL SAN LORENZO	1,391,171.42	FISM	1,391,171.42															1,391,171.42		PROCESO				100%	100%																						
20	1235/7001/0	ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	MUNICIPAL CABECERA	1,411,575.48	FISM	1,411,575.48															1,411,575.48		PROCESO				100%	100%																						
21	1235/1107/0	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER NIVEL DE HOSPITAL EN CALIMAYA	MUNICIPAL CABECERA	3,613,104.89	FAISMU N-HR-07-2024	3,693,286.09															3,693,286.09	19,808.60	PROCESO				100%	99%																						
22	1235/1190/2	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES	MUNICIPAL CABECERA	2,353,985.42	FEFOM-02-2024	2,353,438.25															2,353,438.25	557.17	TERMINADA	D4	31/01/25		100%	100%																						
TOTALES																						47,623,288.64	22 OBRAS	46,638,981.04	984,308.60																									



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY
 Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Recresar principal

Cuenta Contable 1238 ó 1236	Entidad Fiscalizable	Nombre de la obra o acción	Localidad	Importe contrato y/o convenio	Recurso y año	Saldo ejercicio anterior (S.I. Cuenta 1234 ó 1235)	No. estimación	Periodo de estimación	Importe de obra ejecutada en el mes	L.V.A. (6)	Importe total (Cuenta 1235 ó 1236)	Retenciones (Cuenta 2117)				Amortización del anticipo (Cuenta 1154)			Líquido neto (16)	Saldo ejercido acumulado (S.I. Cuenta 1235 ó 1236 ó 1238 ó 1239)	Saldo por ejercer (19)	Estatus (19)	Poliza tipo y número (20)	Fecha (21)	Avance físico (22)	Avance financiero (23)
												2%	0.2%	0.5%	OTROS	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO	NVA								
						(a)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(19)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	1235/17/01/11	ELECTRIFICACION DE CALLE	SAN LORENZO	163,185.35	FISM	163,185.35														163,185.35	0.01	PROCESO				100%
2	1235/11/02/26/01	PEDRO CARMONA ELECTRIFICACION EN ESCUELA CAPEP (JARDIN DE NIÑOS) Y ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	MUNICIPAL SAN ANDRES	500,519.26	2009 FISM	500,519.26														500,519.26	0.00	PROCESO				100%
3	1235/27/02/04/01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y RAHABILITACION DE	MUNICIPAL SAN ANDRES	1,009,712.40	2008 FEFOM	1,009,089.42														1,009,089.42	622.98	PROCESO				100%
4	1235/27/02/05/26	PARAMENTOS DE OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM, INC.: BARRA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA	OCOTLAN ZARAGOZA DE SAN LORENZO	1,098,018.84	2012 FEFOM	918,105.35														918,105.35	179,911.49	PROCESO				84%
5	1235/29/02/04/05	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA	GUADALUPE DE SAN LORENZO	155,980.15	2012 FISM	155,023.80														155,023.80	956.35	PROCESO				98%
6	1235/29/02/05/01	REAL CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE	CUAUHTENCO SAN LORENZO	66,994.18	2012 FISM	55,285.72														55,285.72	11,710.46	PROCESO				83%
7	1235/29/02/06/01	ISABEL VILCHIS CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE	CUAUHTENCO SAN LORENZO	116,987.39	2012 FISM	80,725.61														80,725.61	36,271.78	PROCESO				69%
8	1235/27/02/02/01	ISABEL VILCHIS CONSTRUCCION DE LA CASA	CUAUHTENCO SAN MARCOS	695,067.01	2012 FEFOM	579,546.87														579,546.87	115,521.14	PROCESO				83%
9	20 1235/29/02/07/01	DEL ADULTO MAYOR PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE	DE LA CRUZ SAN MARCOS	852,568.44	2012 FISM	832,830.07														832,830.07	119,799.37	PROCESO				87%
10	25 1235/29/02/13/01	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUVO DE 61 CM. Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONG INDEPENDENCIA HACIA EL ORIENTE UN RECORRIDO DE 200 MTS.	DE LA CRUZ CABECERA	235,654.00	2012 FISM	226,471.36														226,471.36	9,182.64	PROCESO				96%
11	25 1235/39/07/03/01	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SAN LORENZO CUAUHTENCO"	MUNICIPAL SAN LORENZO	5,500,000.00	2012 PAD	5,500,000.00														5,500,000.00	0.00	PROCESO				100%
12	01 1235/39/01/04/01	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	MUNICIPAL	5,490,613.53	03/2014 PAD/04/2	5,490,613.53														5,490,613.53	0.00	PROCESO				100%



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY
Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Retrasar principal		Retrasar principal	
ENTIDAD FISCALIZABLE		Municipio de Calimaya, México.	
N° ENTIDAD FISCALIZABLE		69	
MENS: (1)		MARZO DE 2025	
Cuenta Contable 1235 6 1235		Cuenta 1154	
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
LOCALIDAD		AMORTIZAD O (12)	
IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO		IVA (13)	
RECURSO Y AÑO		SUB TOTAL (14)	
SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 6 1235)		TOTAL DEDUCCIONES (15)	
PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)		LIQUIDO NETO (16)	
No. ESTIMACIÓN (2)		SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 6 1236 6 1236)	
IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)		ESTATUS (19)	
L.V.A. (6)		TIPO Y NÚMERO (20)	
2% (7)		FECHA (21)	
0.2% (8)		FÍSICO (22)	
0.8% (9)		FINANC IERO (23)	
OTROS (10)		AVANCE	
SUB TOTAL (11)		FÍSICO (22)	
IMPORTE TOTAL (Cuentas 1235 6 1236)		FINANC IERO (23)	



OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
Presidente(s) Municipal

JOSÉ ARTURO MÁZQUEZ GUTIÉRREZ
Tesorero(s) Municipal

SULEYKA LETICIA HERNÁNDEZ LEAL
Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	04	2025

Ver: 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y IMPOS.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY
 Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Calimaya, N° ENTIDAD FISCALIZABLE 69 (1) MES: ENERO DE 2025

CÓDIGO FONDO	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)		IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)				MAQUINARIA Y EQUIPO(4)	TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)
1	5100/3511/202	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	TODO EL	R.P. 2025						PROCESO				
2	5600/6139/202	DE INMUEBLES REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	MUNICIPIO TODO EL	R.P. 2025						PROCESO				
3	5600/6159/202	DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	MUNICIPIO TODO EL	R.P. 2025		60,250.00		60,250.00	60,250.00	PROCESO	E17	31/01/25	4%	3%
4	5	DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	MUNICIPIO											
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTALES						10 IMROMS	60,250.00	60,250.00						



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY
 Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Calimaya, N° ENTIDAD FISCALIZABLE 69 (1) MES: ENERO DE 2025

CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
					MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)



OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
 Presidente(a) Municipal



JOSÉ ARTURO GARCÍA GUTIÉRREZ
 Tesorero(a) Municipal

YAZMIN JESSICA ALEGRIA ALEGRIA
 Secretario(a) del Ayuntamiento



SULEYKA LETICIA HERNÁNDEZ LEAL
 Director(a) Obras Públicas

DÍA	MES	AÑO
02	05	2025

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY

Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: **Municipio de Calimaya, México.** N° ENTIDAD FISCALIZABLE: **69**

(1) MES: **FEBRERO DE 2025**

CÓDIGO	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	TIPO Y NÚMERO (8)	PÓLIZA	AVANCES		
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)					FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)	
1	5100/3511/2025	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	TODO EL	R.P. 2025					-	PROCESO					
		INMUEBLES REPARACIÓN Y	MUNICIPIO TODO EL												
2	5600/6139/2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		R.P. 2025					-	PROCESO					
		HIDRÁULICA REPARACIÓN Y	MUNICIPIO TODO EL												
3	5600/6159/2025	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		R.P. 2025	60,250.00			60,250.00	-	PROCESO			4%	3%	
4		ALUMBRADO	MUNICIPIO												
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTALES											10 IMROMS			60,250.00	



Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY

Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

Municipio de Calimaya, N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 69


(1) MES: FEBRERO DE 2025

CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)
					MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)		



OMAR GUILLERMO SANCHEZ VELAZQUEZ

Presidente(a) Municipal

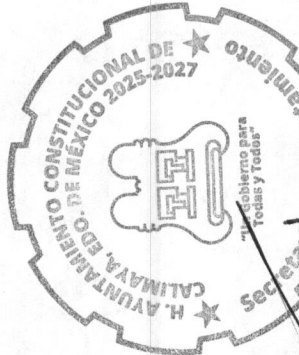

JOSÉ ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ

Tesorero(a) Municipal



SULEYKA LETICIA HERNANDEZ LEAL

Director(a) Obras Públicas

DÍA 02 MES 05 AÑO 2025

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Callimaya, N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 69 (1) MES: MARZO DE 2025

N° PROM	CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)			IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES			
						MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)	MAQUINARIA Y EQUIPO(4)				TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)	FINANCIERO (11)		
1	5100/3511/2025	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	TODOS EL	R.P. 2025					-		PROCESO						
		INMUEBLES REPARACIÓN Y	MUNICIPIO TODO EL														
2	5600/6139/2025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO TODO EL	R.P. 2025					-		PROCESO						
		HIDRÁULICA REPARACIÓN Y	MUNICIPIO TODO EL														
3	5600/6159/2025	MANTENIMIENTO DE	MUNICIPIO	R.P. 2025	60,250.00				60,250.00		PROCESO			4%	3%		
4		VIALIDADES Y ALUMBRADO	MUNICIPIO						-								
5									-								
6									-								
7									-								
8									-								
9									-								
10									-								
TOTALES											10 IMROMS	60,250.00	-	-	-	-	-



Avuntamiento 2025-2027
Calimaya
un gobierno para Todos y Todas

Elaboró: ROBERTO FUENTES MONROY

Revisó: ROBERTO FUENTES MONROY

INFORME MENSUAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS (IMROM)

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Calimaya, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 69

(1) MES: MARZO DE 2025

CLAVE DE LA ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	RECURSO Y AÑO	SALDO ANTERIOR (a)	INSUMOS (Movimientos a Cuentas de Gasto)		IMPORTE TOTAL (5)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (6)	ESTATUS (7)	PÓLIZA		AVANCES	
					MATERIALES(2)	MANO DE OBRA(3)				MAQUINARIA Y EQUIPO(4)	TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)	FÍSICO (10)




OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

Presidente(a) Municipal



YAZMIN JESSICA ALEGRIA ALEGRIA

Secretario(a) del Ayuntamiento

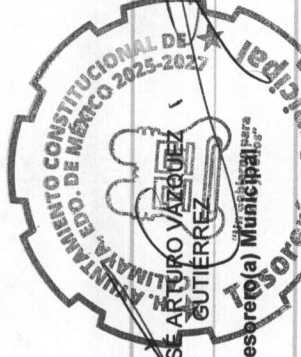

JOSÉ ARTURO VARGÜEZ GUTIÉRREZ

Tesorero(a) Municipal



SULEYKA LETICIA HERNÁNDEZ LEBAL

Director(a) Obras Públicas

DÍA	MES	AÑO
02	05	2025

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.
